


正式背景上的京张双答运营层

规划是可信底图；公共十字与三站才是设计主角

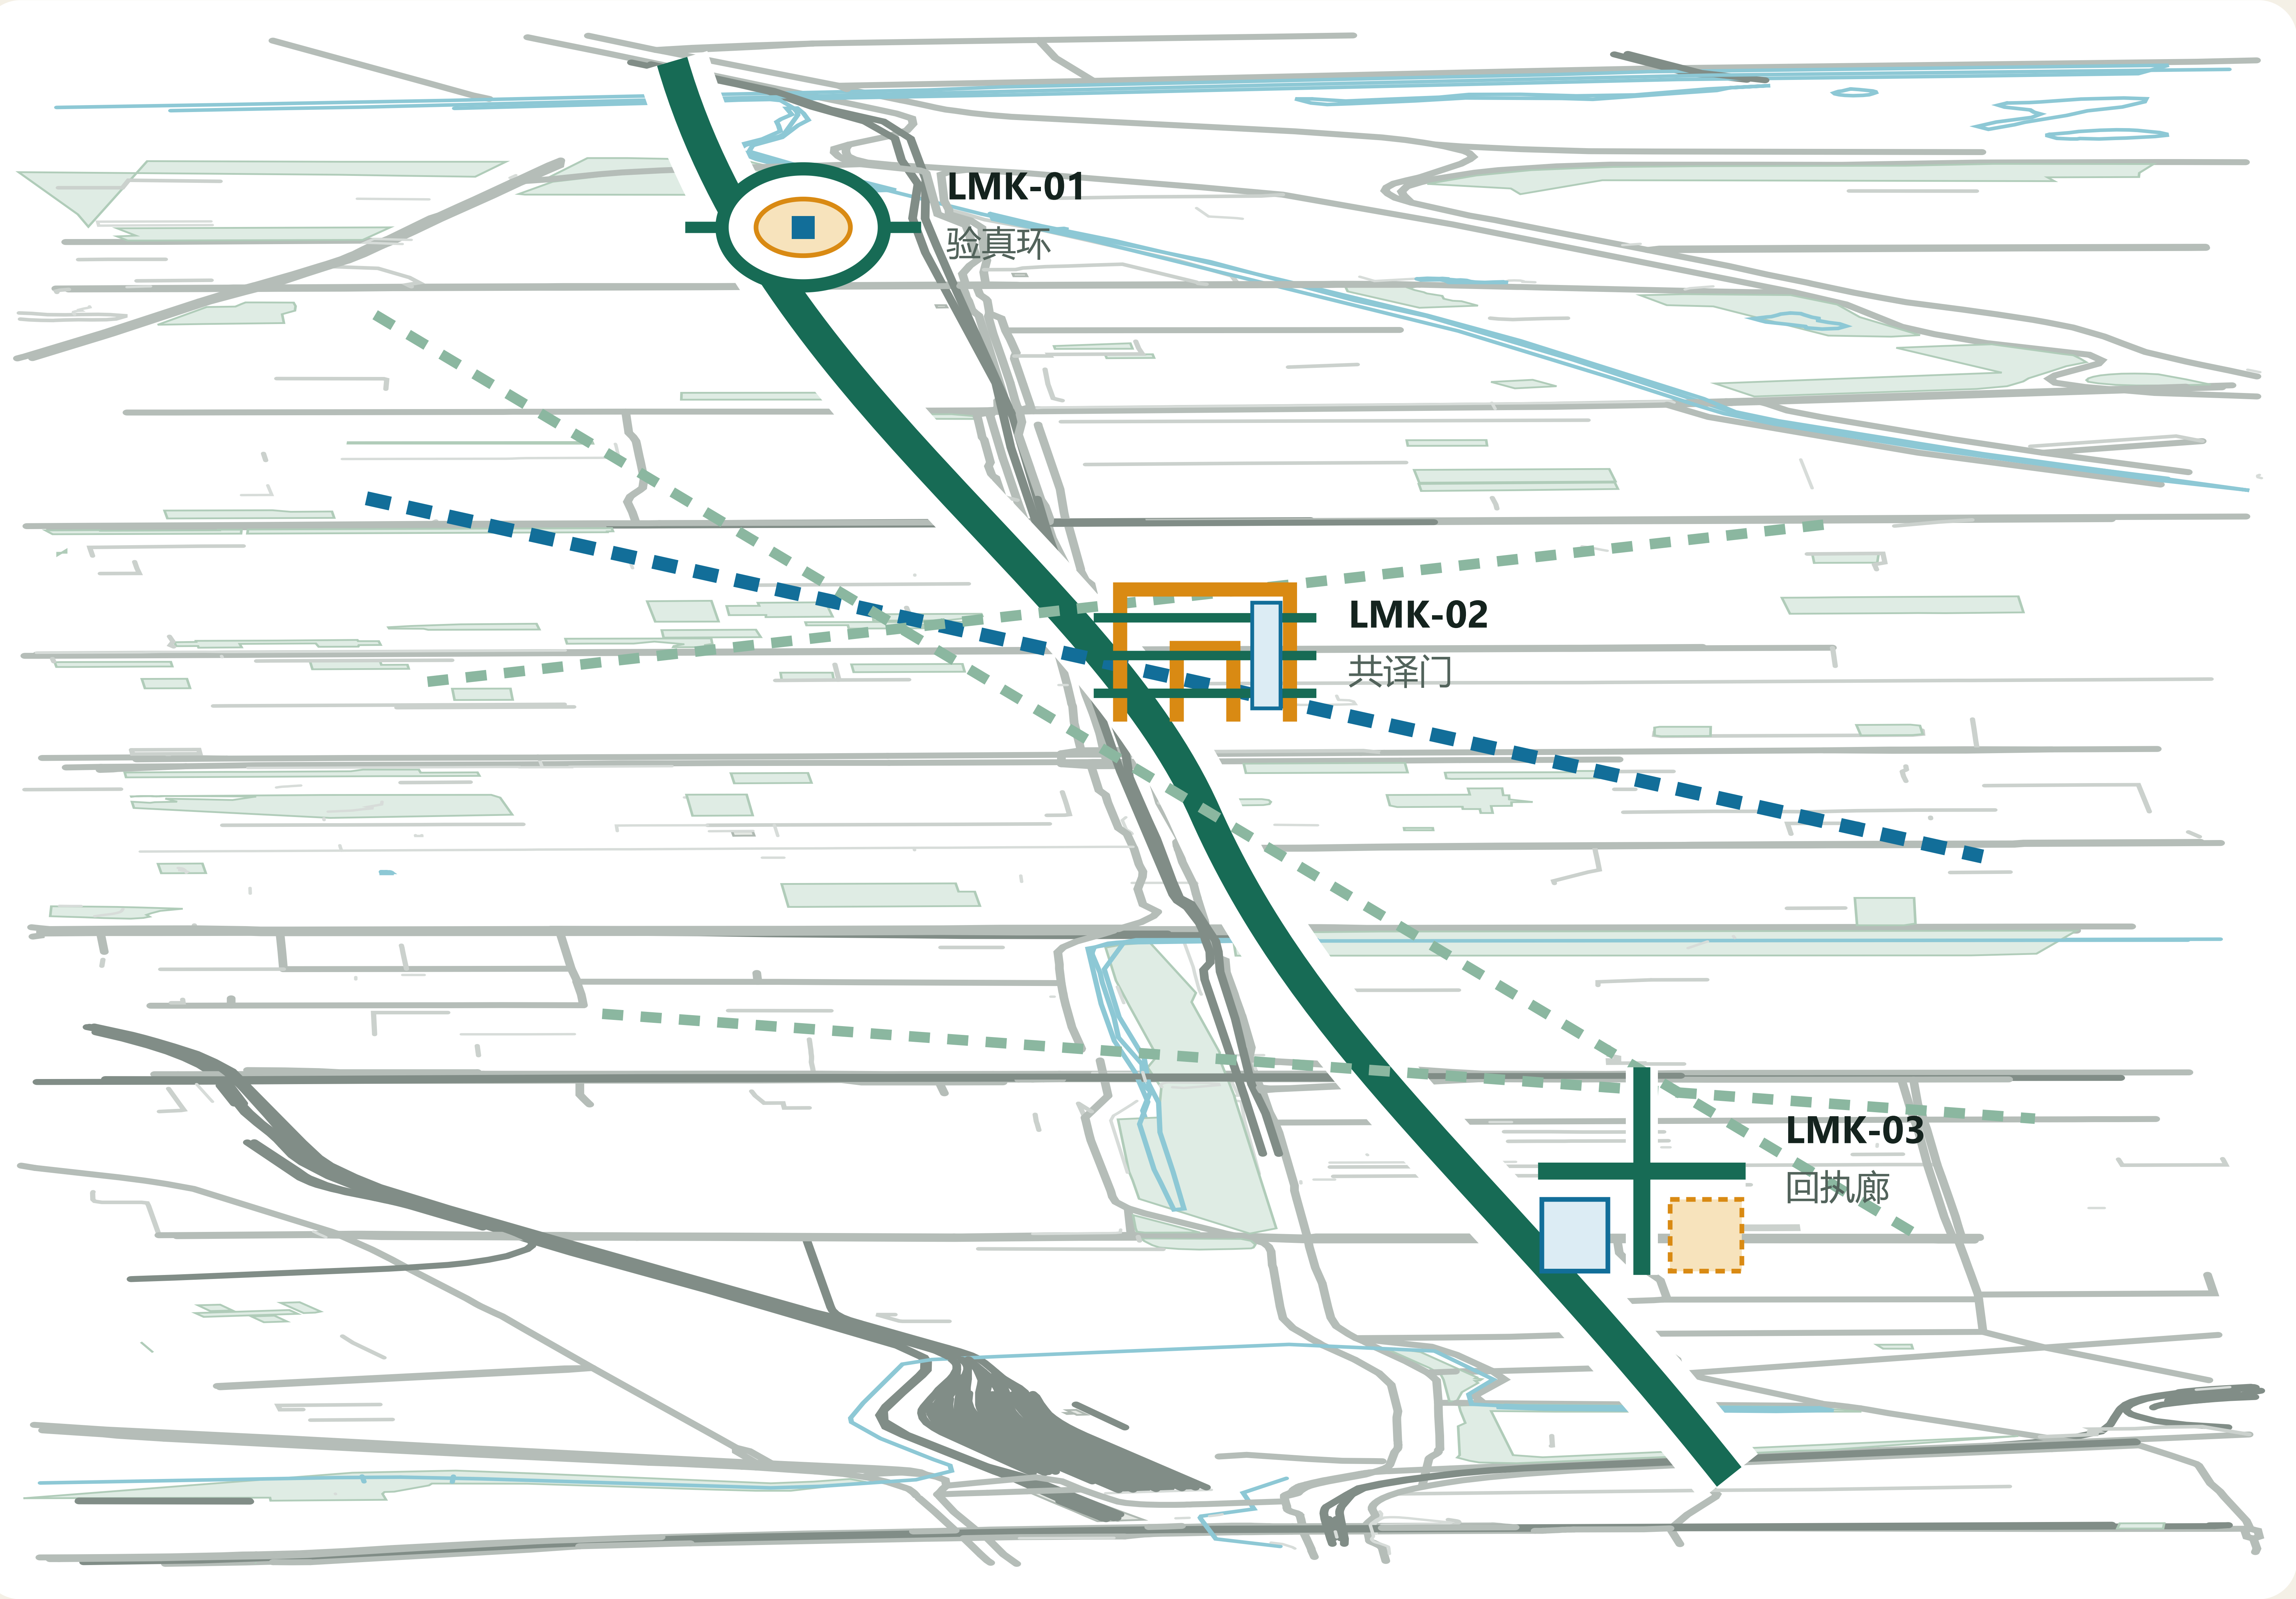

Map data © OpenStreetMap contributors · ODbL · 2026-08-13

一条已公布绿带

一脊三站两翼 = 可停、可撤运营叠加

既有 / 已公布

9km绿带、慢行方向、大钟寺中心

投稿设计

4m路线、单侧湾、人工回执廊

接口窗


环旁路 / 门穿行 / 廊公共十字

未知待核验


测绘、产权、站口、管线、许可




普通开放日
概念生成图 / 非现场证据；尺寸与边界以矢量模型为准

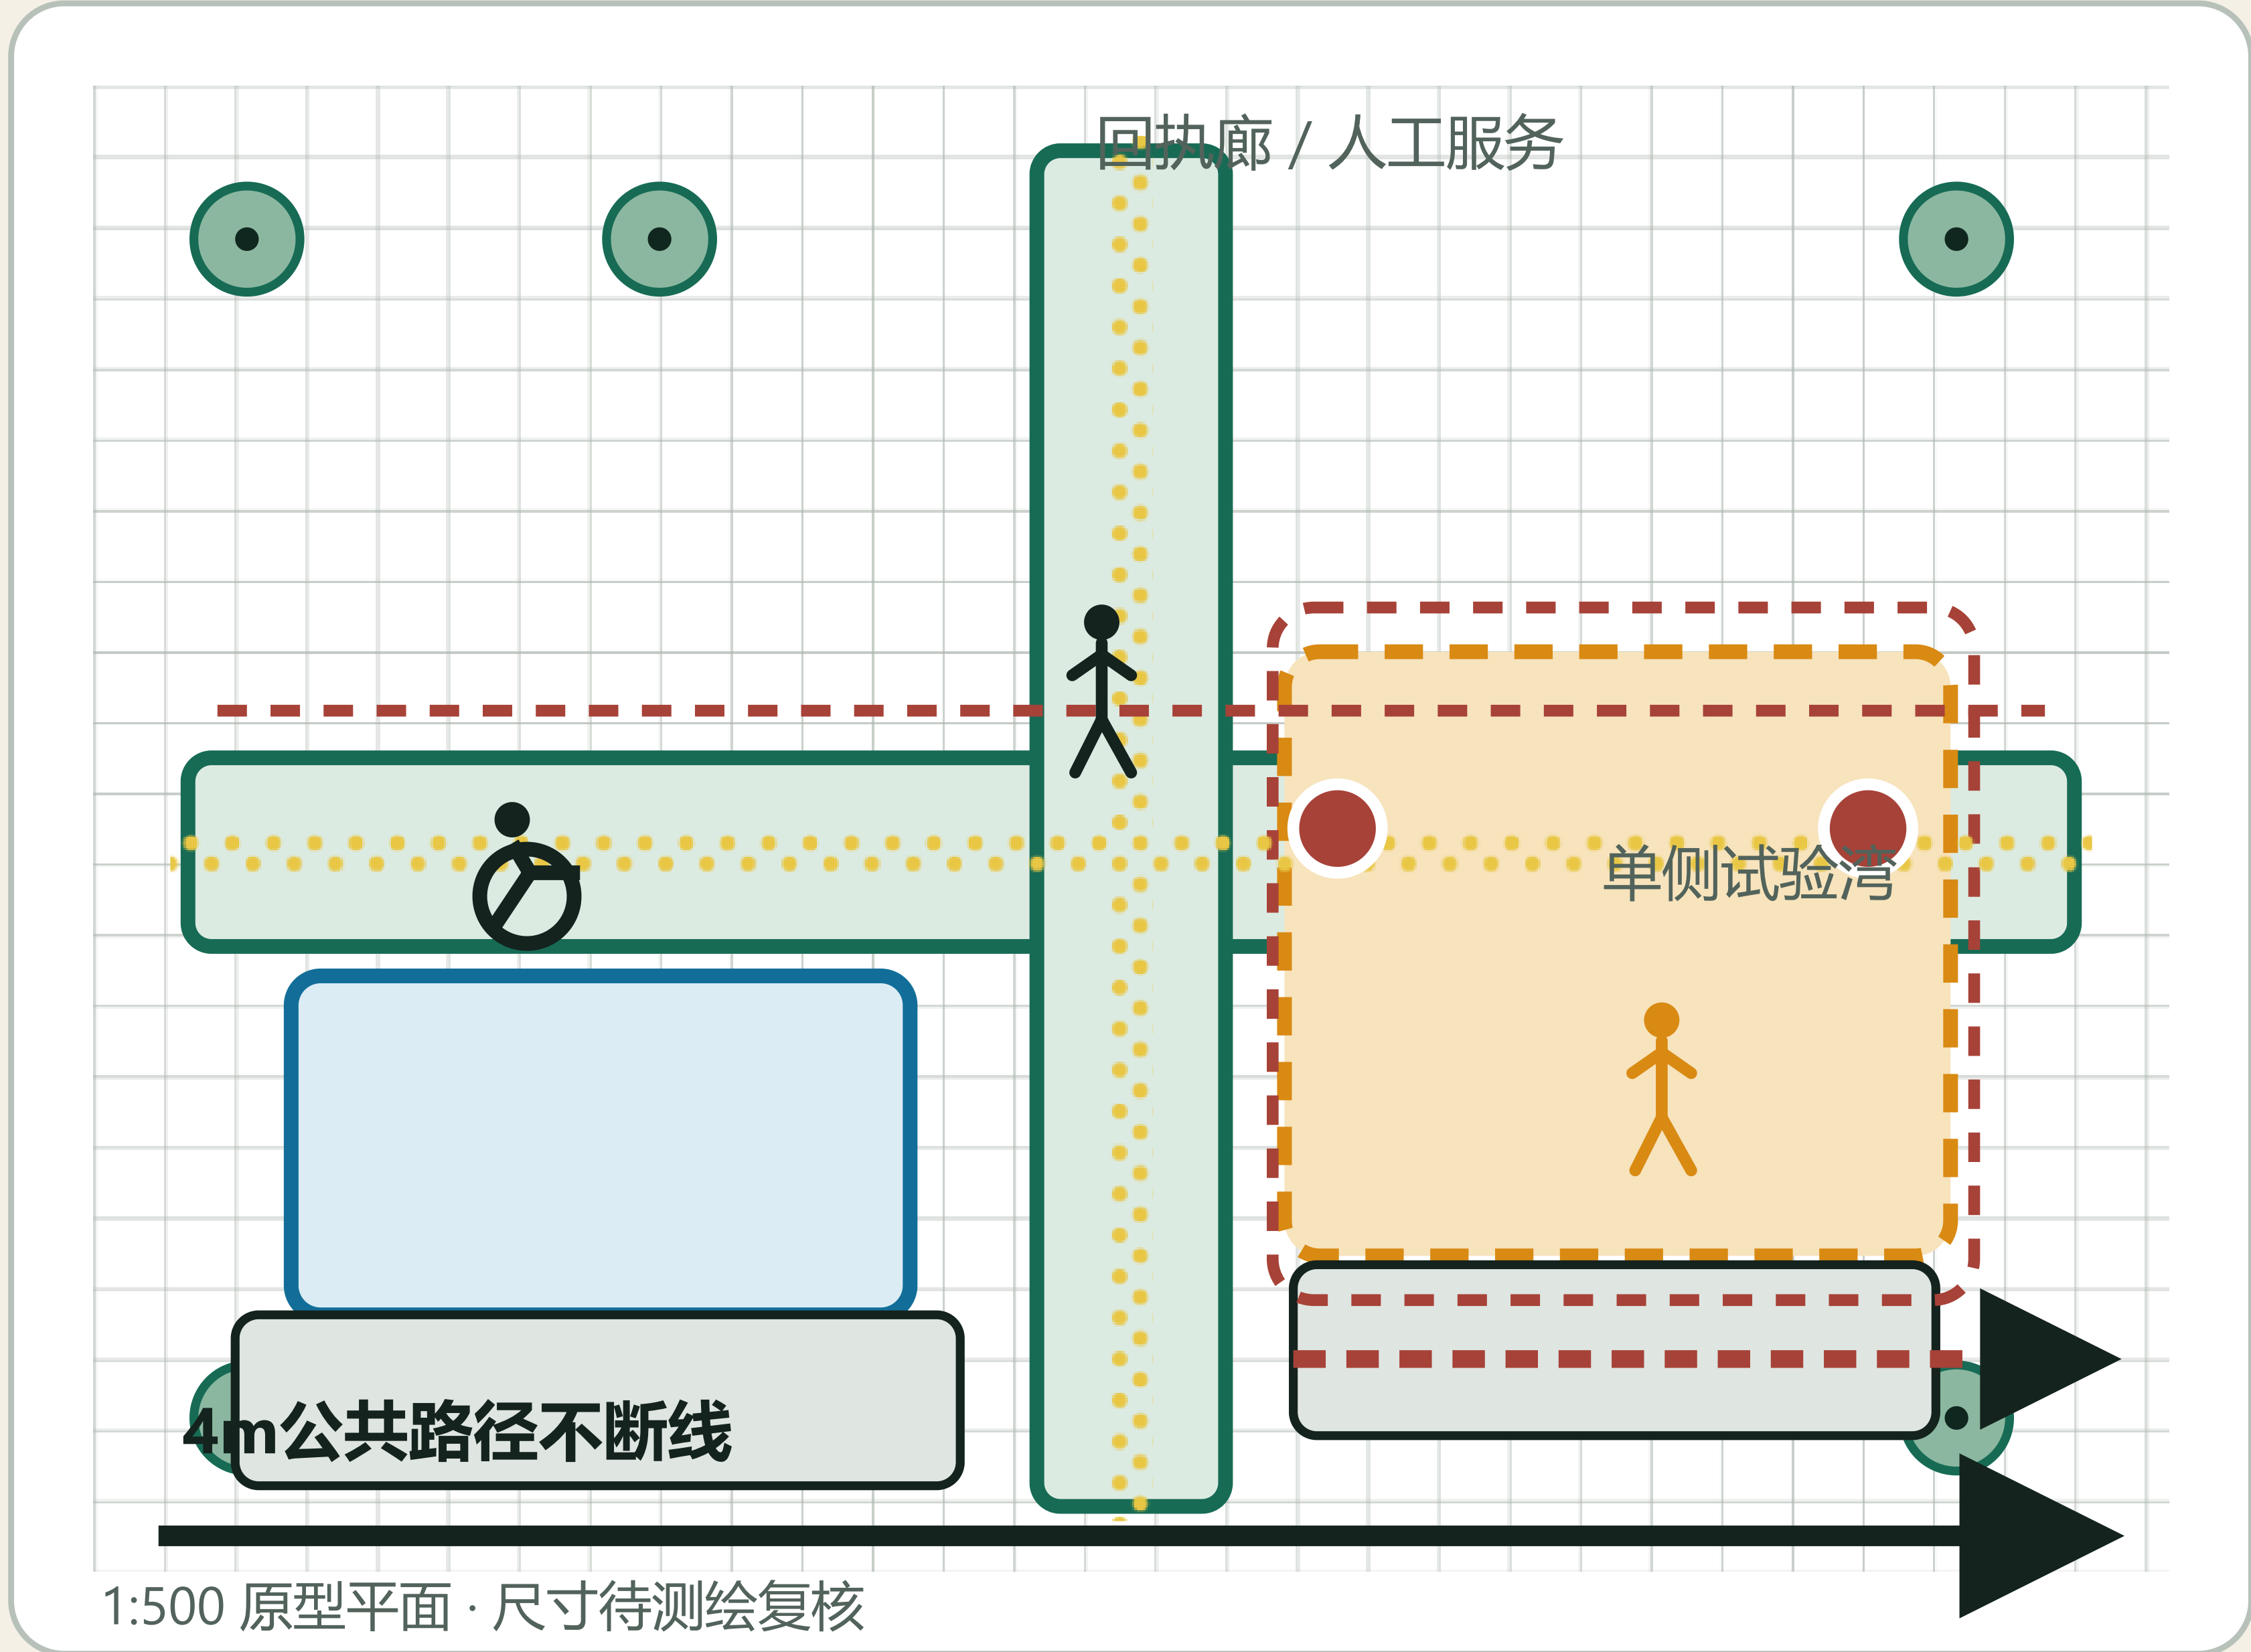



同一空间模型 | 分层剖切装配轴测

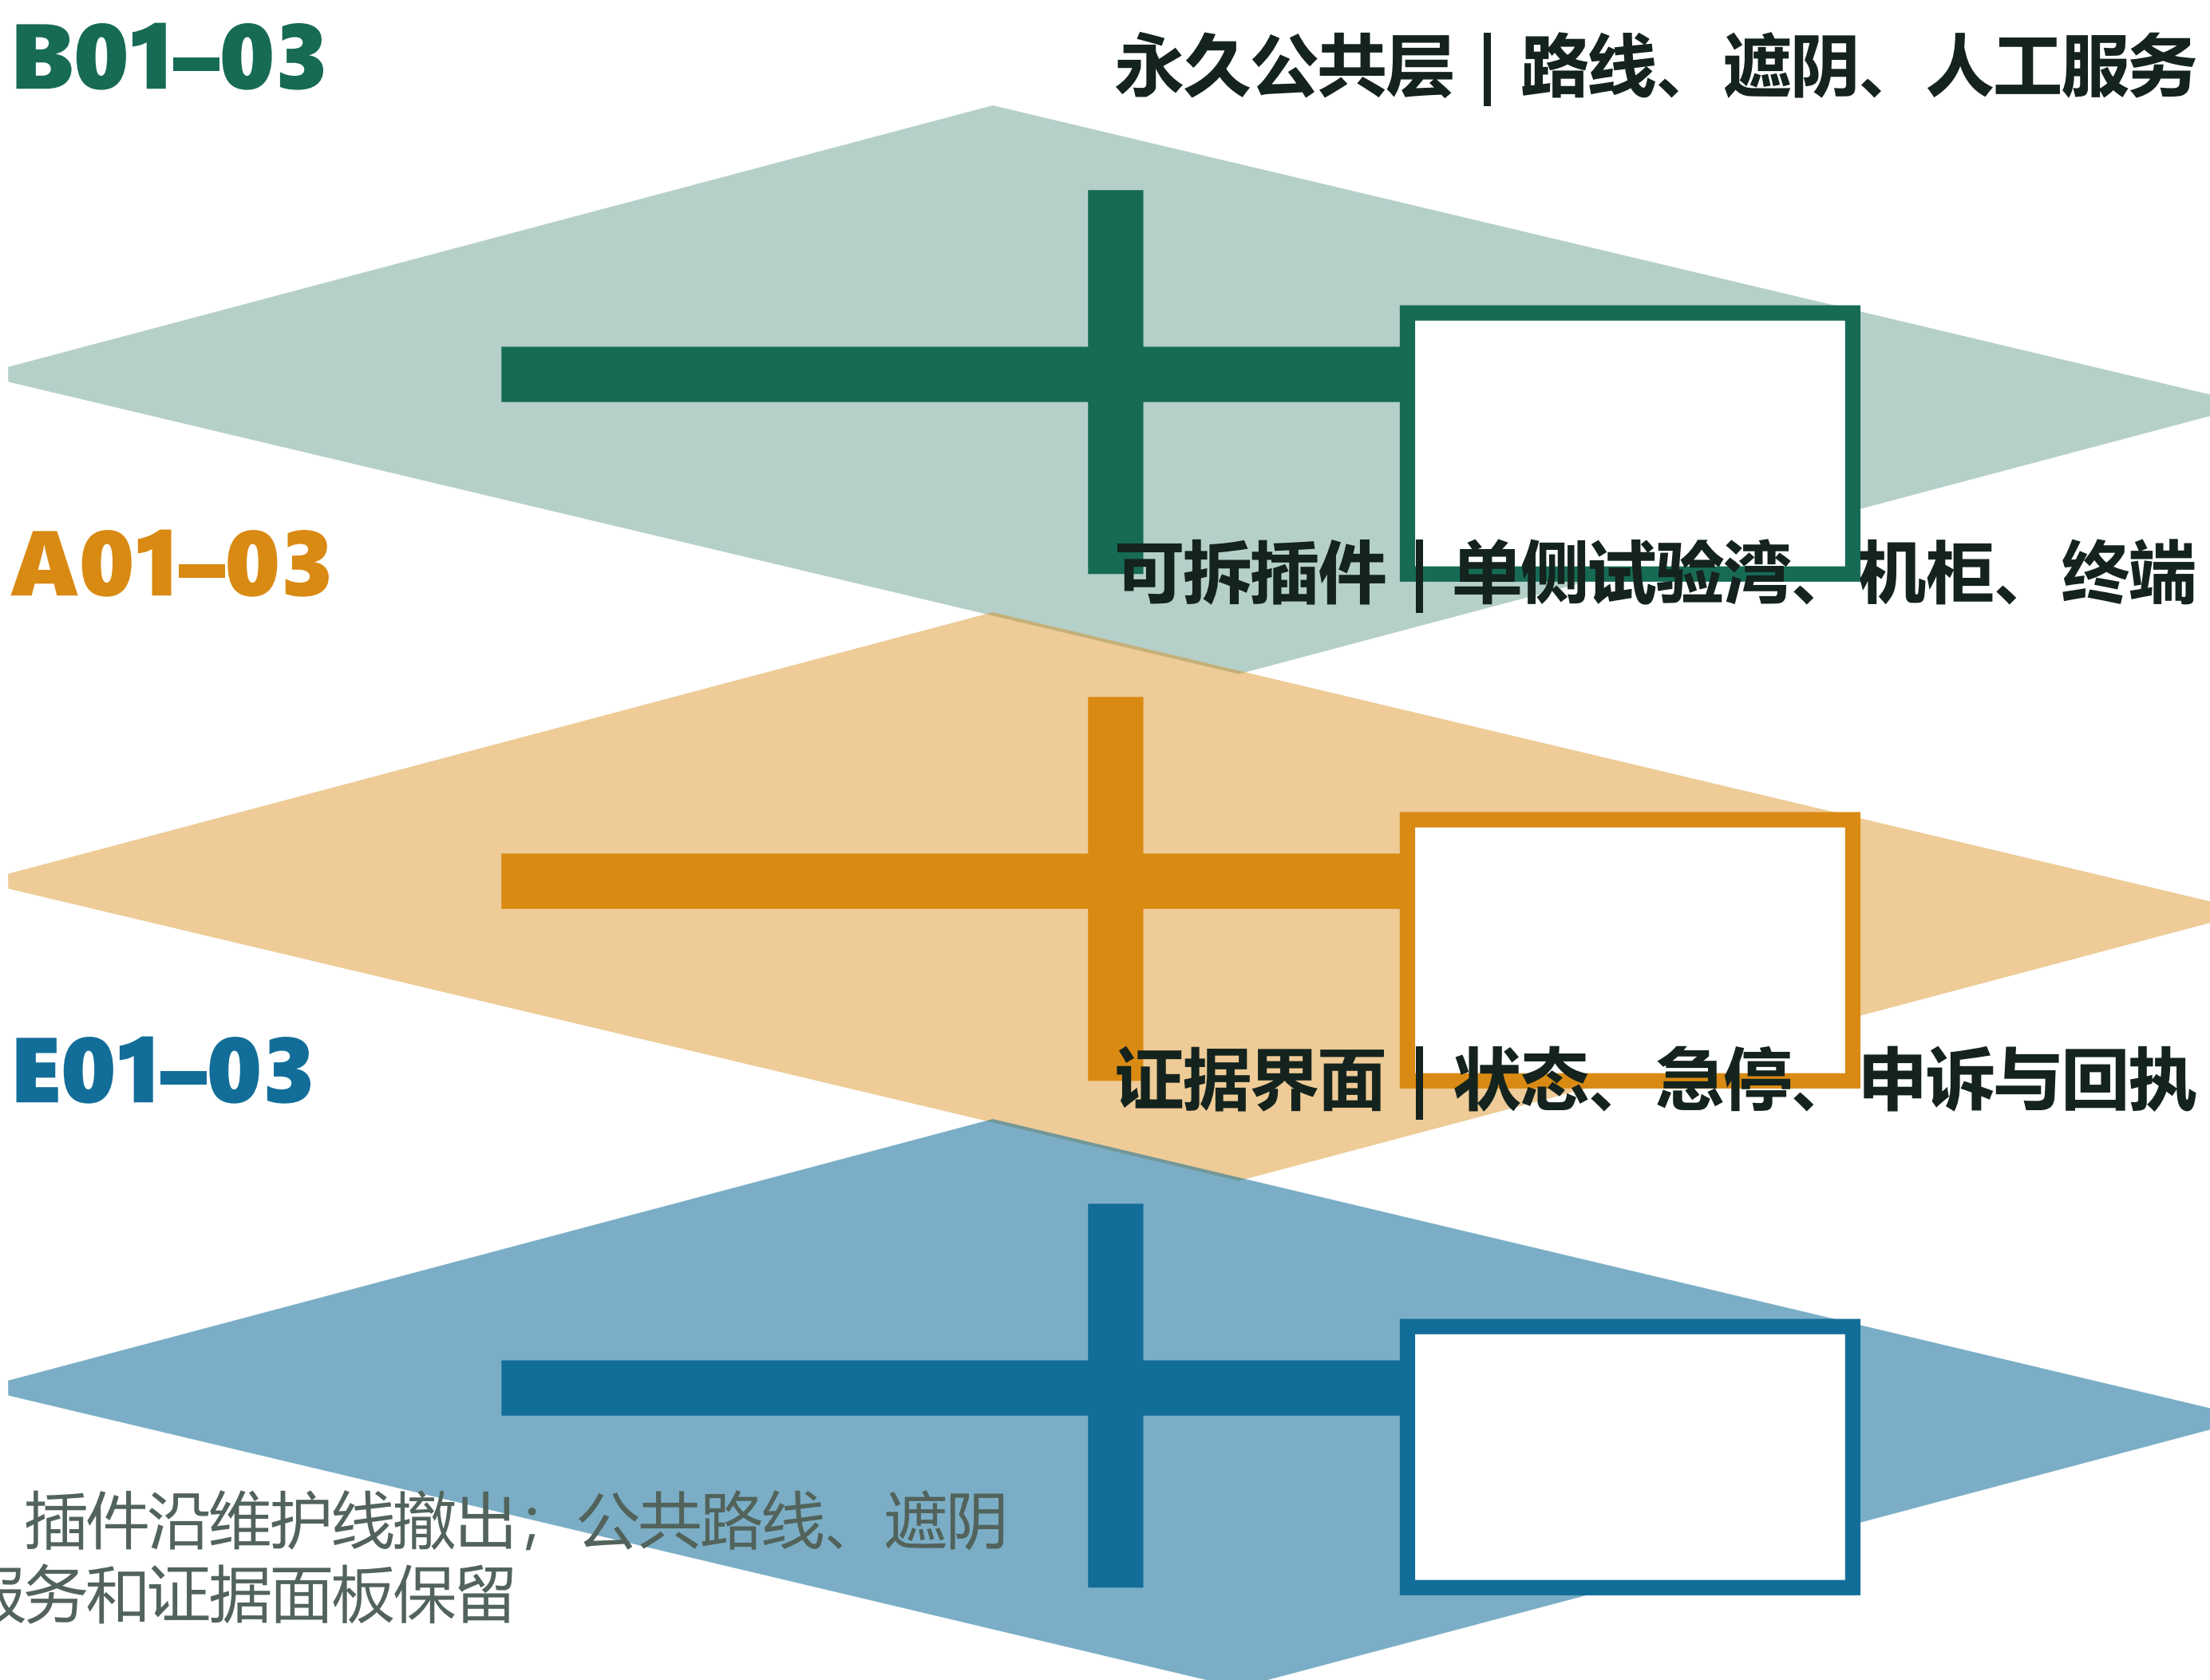

受控试验日 | 公共路径—缓冲—试验湾—回执廊

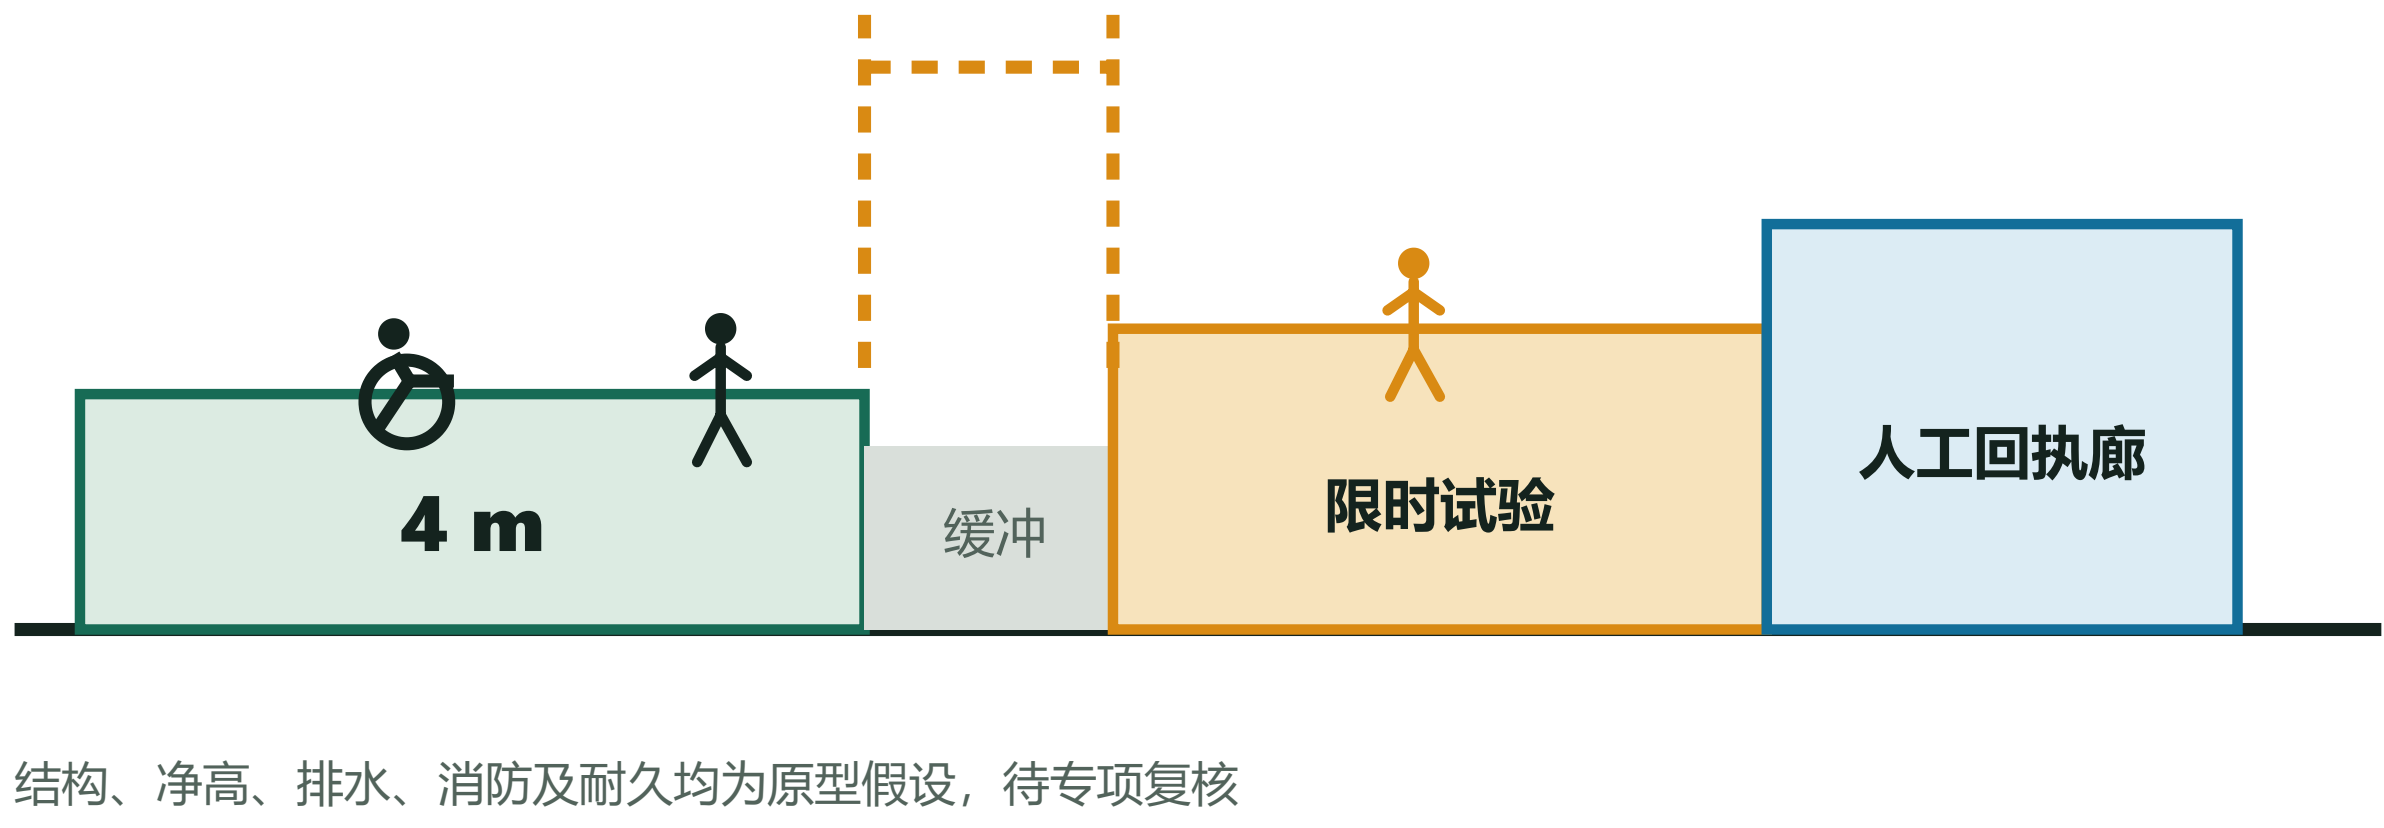

1:50 / 1:20 可逆节点 | 公共层先成立

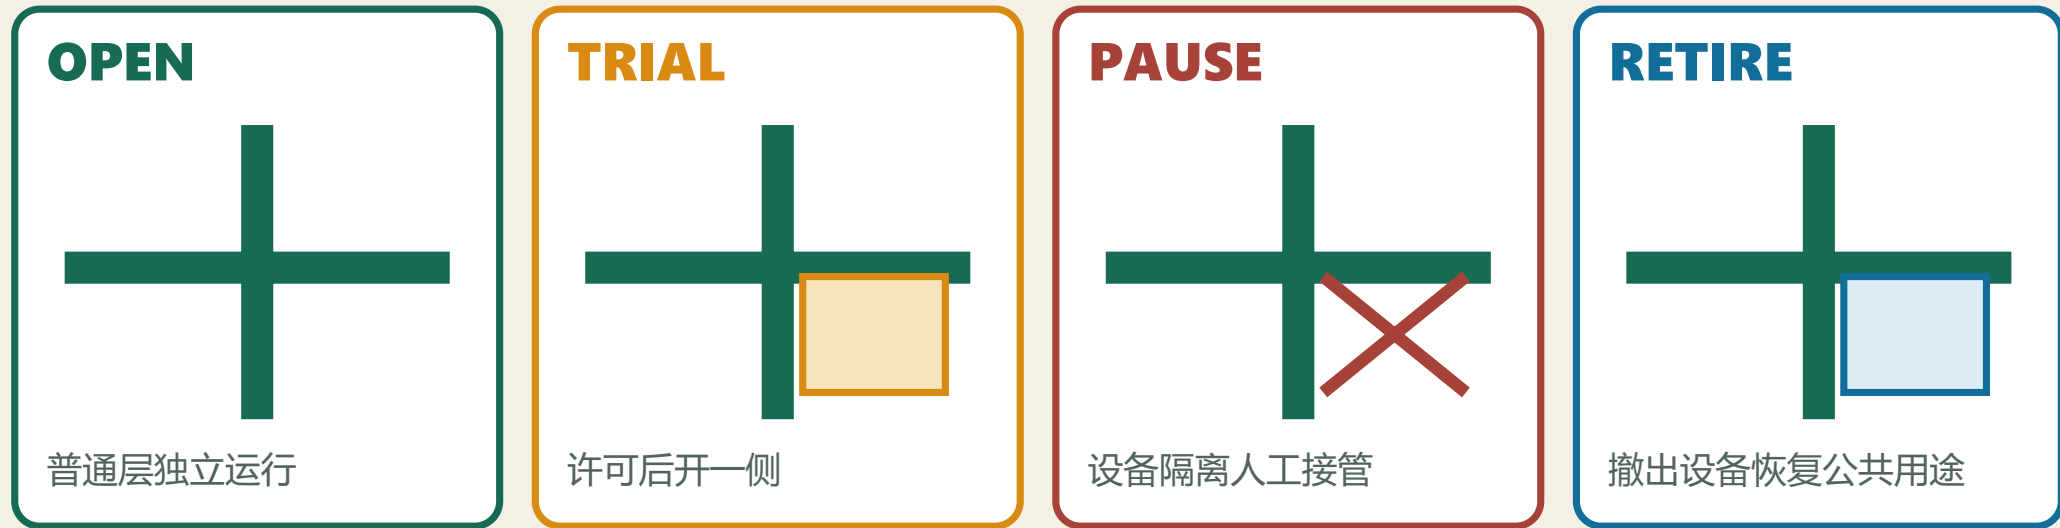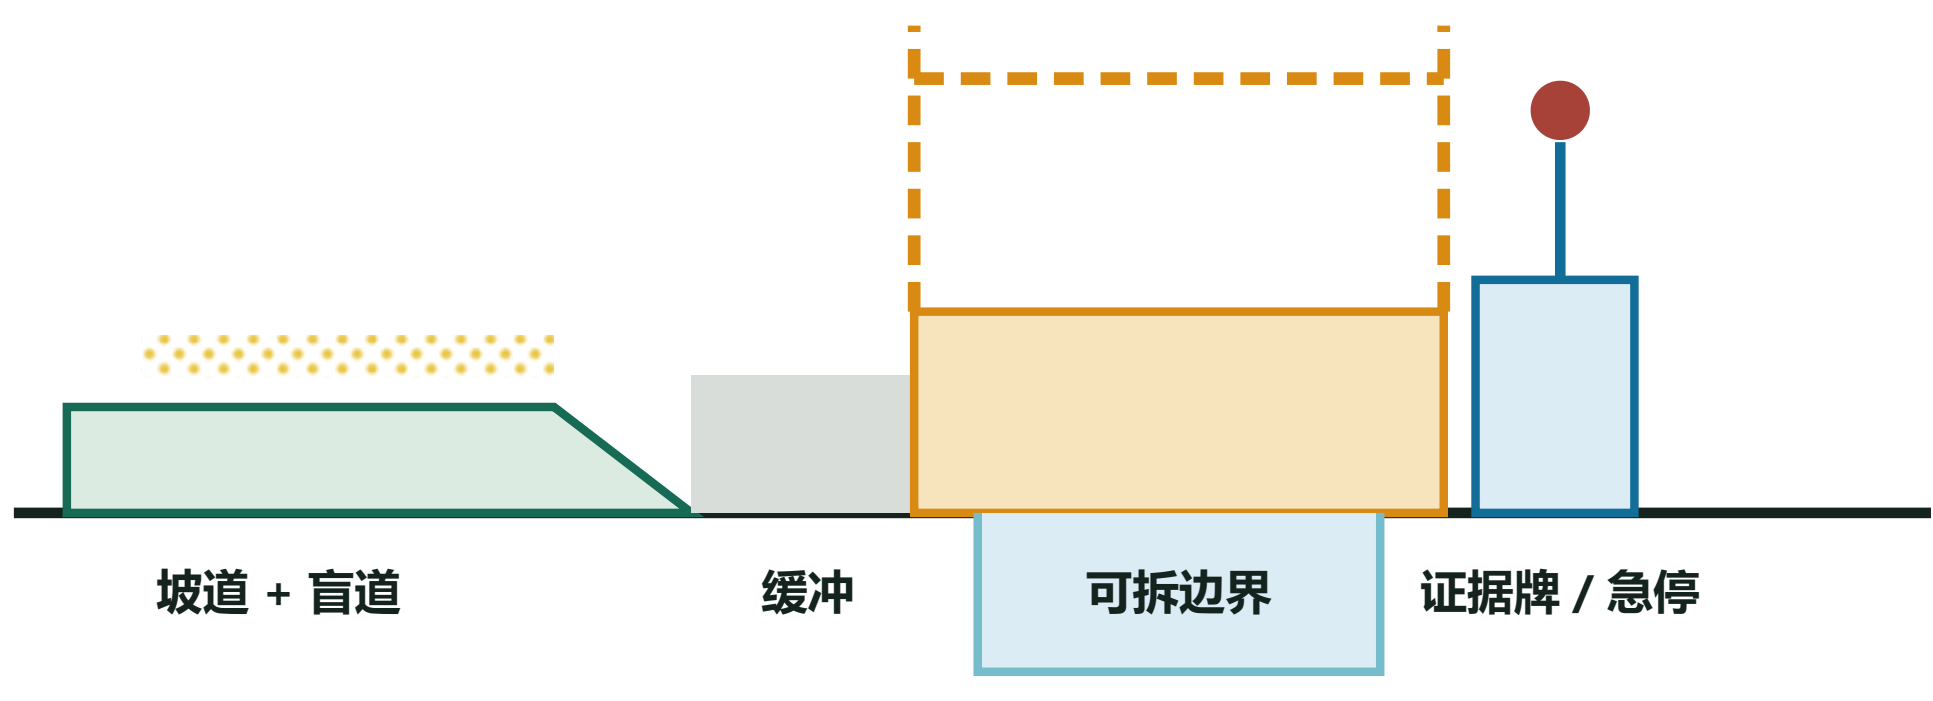

S7预可行性裁定台 | 参与者可判断，外部条件保持HOLD

容量、人员、成本、依赖和验收用同一组可复算输入

01	02	03	04
12 人同时使用上限 48m²回执廊 按4m²/人舒适容量假设 两条4m路线 不计入占用面积，四态始终畅通 5m几何距离 开放门廊半对角线；非法定疏散结论 试验湾 无公众停留，仅责任岗位进入	2.28 FTE-equivalent 普通服务 1.20 40h/周 + 20%替补 场地 0.36 12h/周 + 20%替补 安全 0.36 岗位不得与普通服务混任 数据 0.36 供应商技术员不得替代责任岗位	7 / 3 成本类别 / ROM情景 LOW / BASE / HIGH 费率输入0.8 / 1.0 / 1.2 10% + 15% + 20% 设计 / 安装物流 / 不确定性暂列 12%恢复准备金 按可拆工程小计，独立于基础ROM 正式总价空值 缺少同口径费率即待正式报价	10 项关键依赖 验收 8 + 4 8项设计可判；4项必须现场取得 许可 0 / 8 任一未闭合即不得进入TRIAL 报价 / 运营 0 无正式报价、无具名运营主体 当前状态 参与者预可行性完成；外部HOLD

容量、FTE和ROM均为参与者设计假设；测绘、专业复核、预算授权与现场绩效仍待取得。

同一把尺子：三个备选，一次公开否决

ALT-A 中央混台湾 REJECT · 切断公共十字 公共路线、消防与撤场发生硬冲突。	ALT-B 分散双湾 REVISE · 监督/撤场碎片化 公共路线保留，但岗位与设备退出不集中。	ALT-C 单侧可逆湾 ADVANCE · 四态路线连续 AI集中于一侧；岗位、急停与退出可达。
--	--	--

结果来自局部米制几何审计；不是现场交通、安全或公众接受度结论。

reject_design / revise_design / advance_design ≠ adopt / revise / stop

普通开放日先运行 | 90天是五道进入条件

DAY 0-15 测绘/权属/站口/管线/消防核验 失败 → 不进入下一阶段	DAY 16-30 只搭公共路径、候车、遮阴、人工服务 失败 → 不进入下一阶段	DAY 31-45 记录7个连续普通运行日 失败 → 不进入下一阶段	DAY 46-75 许可+岗位齐全后限时试验 失败 → 不进入下一阶段	DAY 76-90 停止演练、撤场恢复、公众回执 失败 → 不进入下一阶段
---	---	---	--	--

构件—许可—维护直接对应图面	
B01-03	公共路线/遮阴/人工服务 日检；永久保留
A01-03	试验湾/机柜/终端 每次试验前；撤出
E01-03	状态/急停/回执 开闭场复核；面板保留
MAT-01-05	干式钢架/屏/基础/铺装/面板 专项复核；可逆装配

责任与下一道门	
01	场地负责人 待落实
02	普通服务人员 待落实
03	安全负责人 待落实
04	数据记录人员 待落实
当前 G0：进入测绘与许可准备	
PENDING_MARKET_QUOTE · NOT BUILT · NOT FIELD-RUN	

价格只保留数量公式；任何许可、岗位、普通基线或撤场演练失败，都不进入AI试验。
